



Rénovation des ouvrages du Pont Corneille et des accès à l'île Lacroix

Travaux de février 2024 à mai 2026



Planning général des travaux

2024-2026

Les travaux consistent en la reprise des garde-corps, la réparation des bétons sur échafaudages et des travaux sur galeries techniques. 28 mois de travaux de génie civil à partir de février 2024 et 12 mois de travaux de chaussée.

Janvier à juin 2024	Juillet à déc. 2024	Janvier à juin 2025	Juillet à déc. 2025	Janvier à mai 2026
<ul style="list-style-type: none">▪ Préparation de chantier▪ Déblocage des tabliers (rive droite et rive gauche)	<ul style="list-style-type: none">▪ Remise en peinture de l'ouvrage rive droite▪ Reprise de l'étanchéité et des joints de chaussée ouvrage rive droite	<ul style="list-style-type: none">▪ Remise en peinture de l'ouvrage rive droite (suite)▪ Remise en peinture de l'ouvrage rive gauche▪ Reprise de l'étanchéité et des joints de chaussée ouvrage rive gauche	<ul style="list-style-type: none">▪ Remise en peinture de l'ouvrage rive gauche (suite)	<ul style="list-style-type: none">▪ Remise en peinture de l'ouvrage finitions après travaux dans galeries techniques▪ Dépose des échafaudages▪ Équipements sur galeries techniques
Plans de circulation n°1 et n°2	Plans de circulation n°3, n°4 et n°5	Plan de circulation n°6		

Plan de circulation n°1

MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE - 02/2024
Travaux Pont Corneille
25/03 - 13/05/24

- Grand terrassement en arrière des culées
- Dépose des joints de chaussée
- Réparations diverses


Légende

Circulation



- Section Barrée
- Sens non modifiée
- Sens modifiée
- Voie Bus
- Chantier





Déviations sur lignes de transports en commun

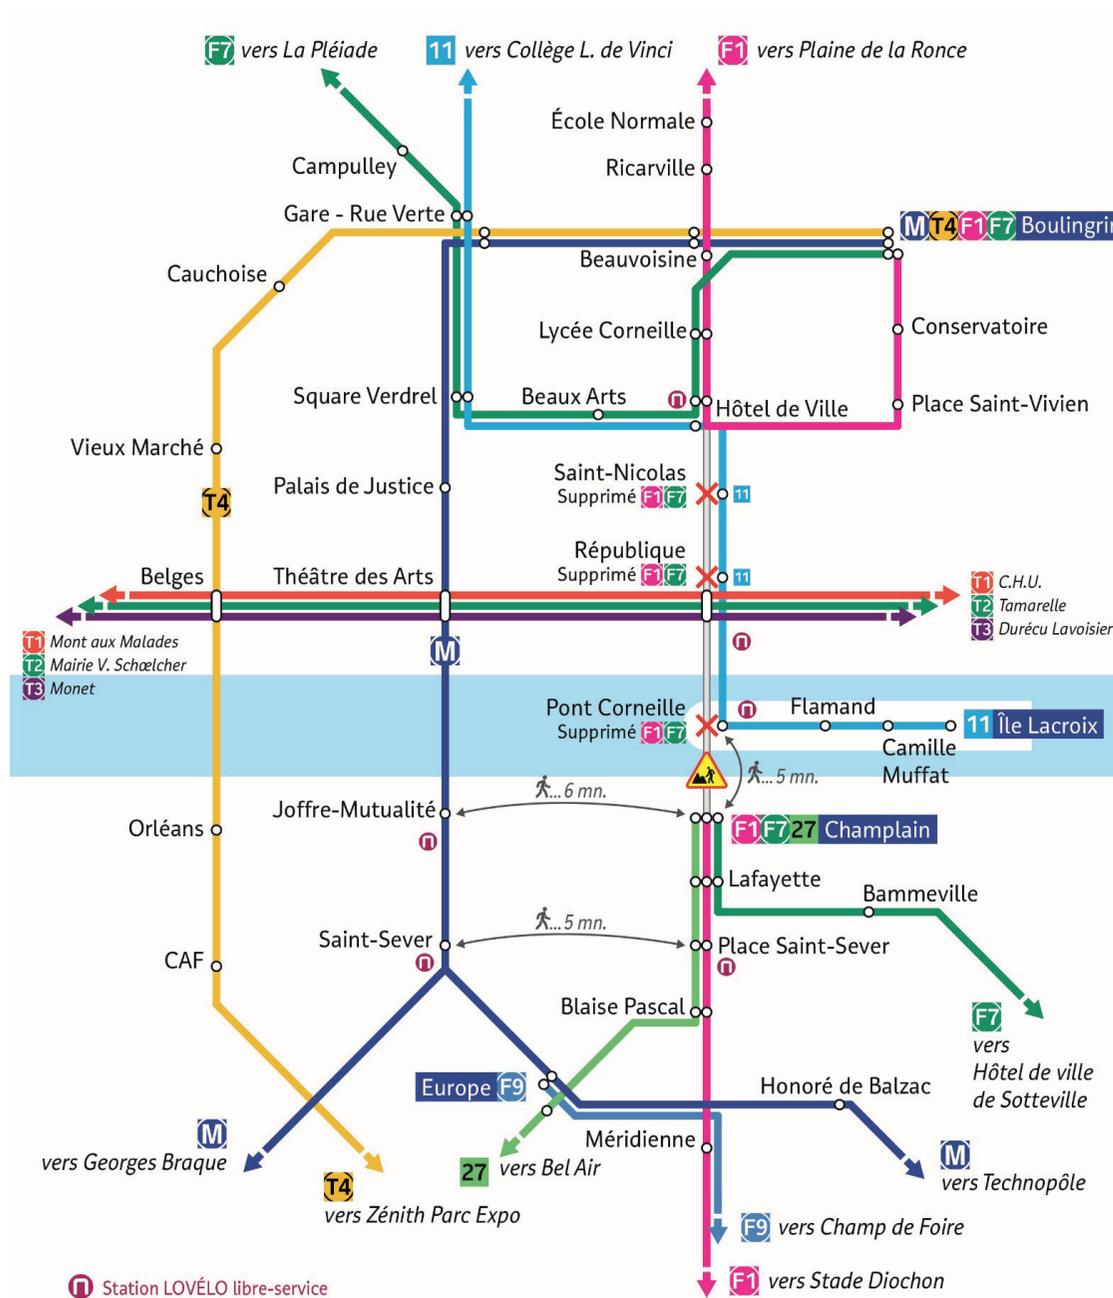


Déviations sur lignes de transports en commun

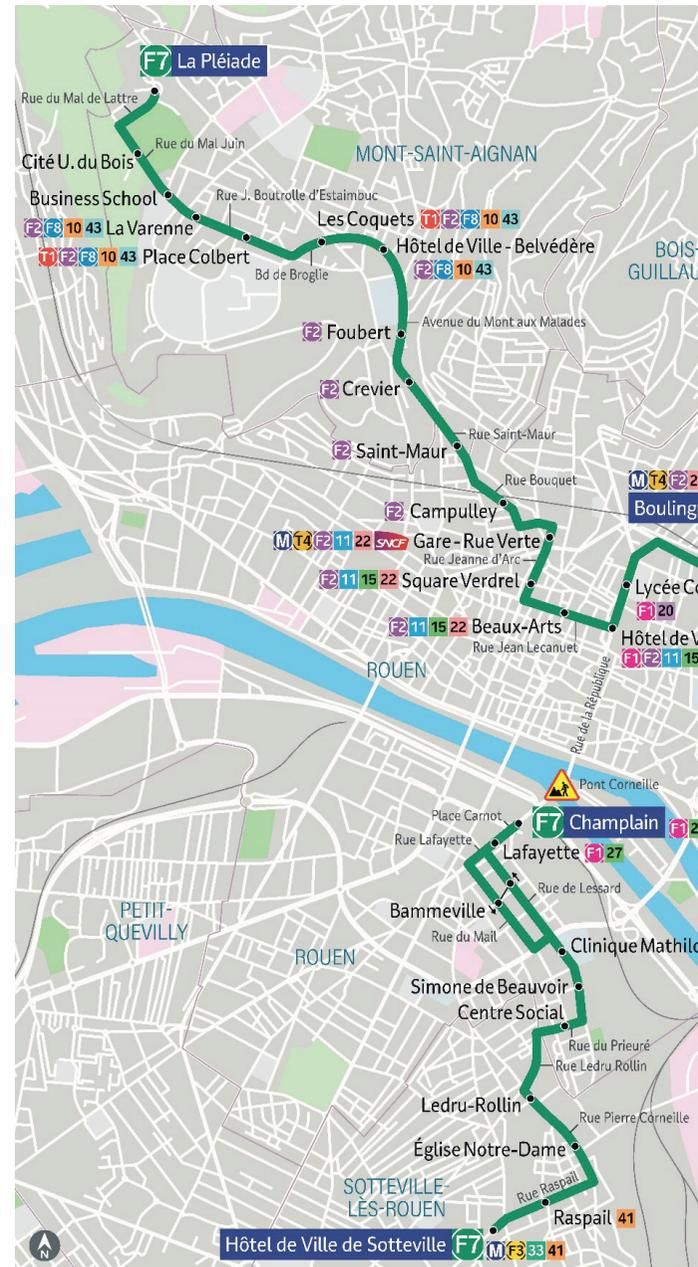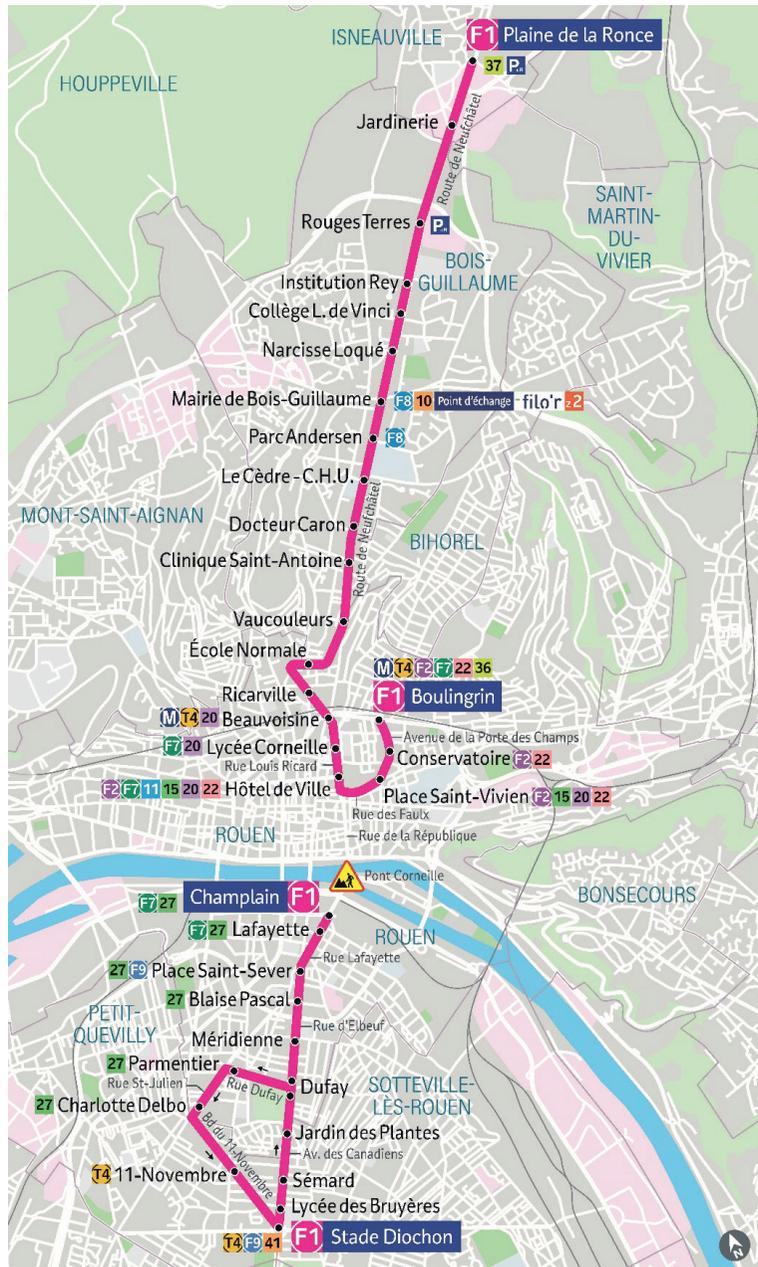

Déviations sur lignes de transports en commun

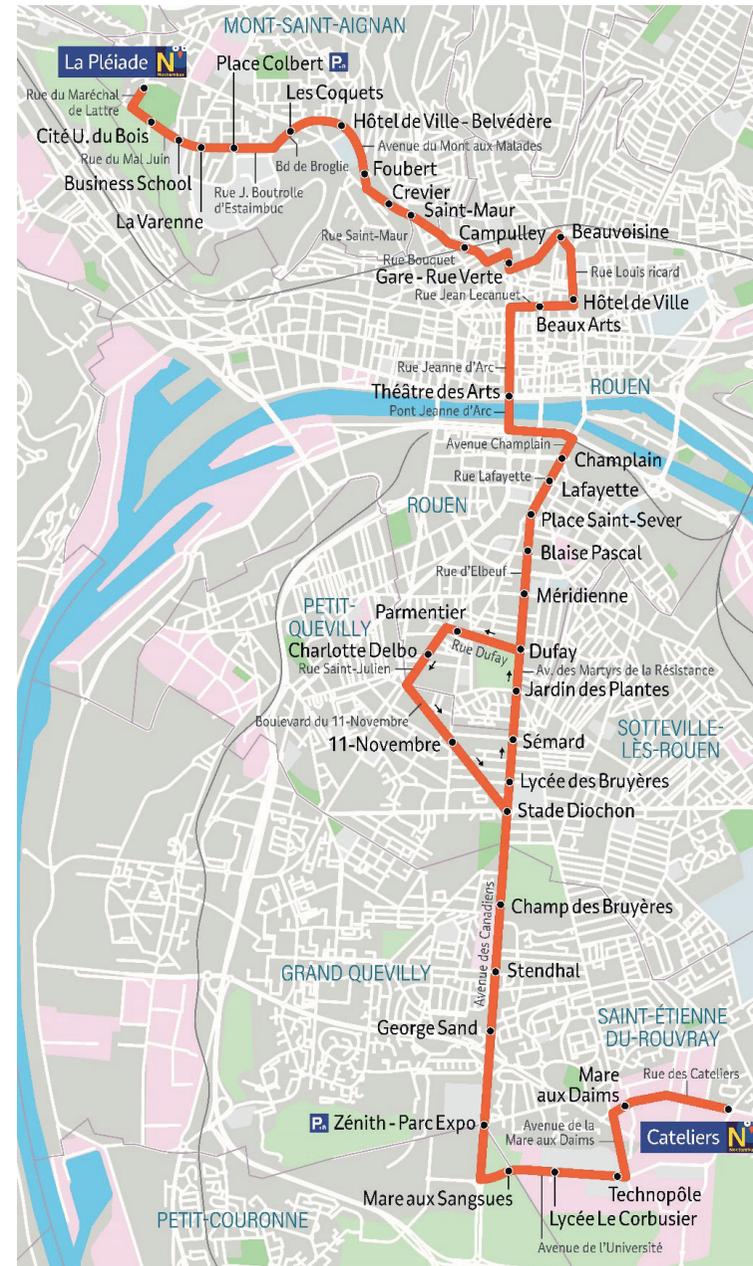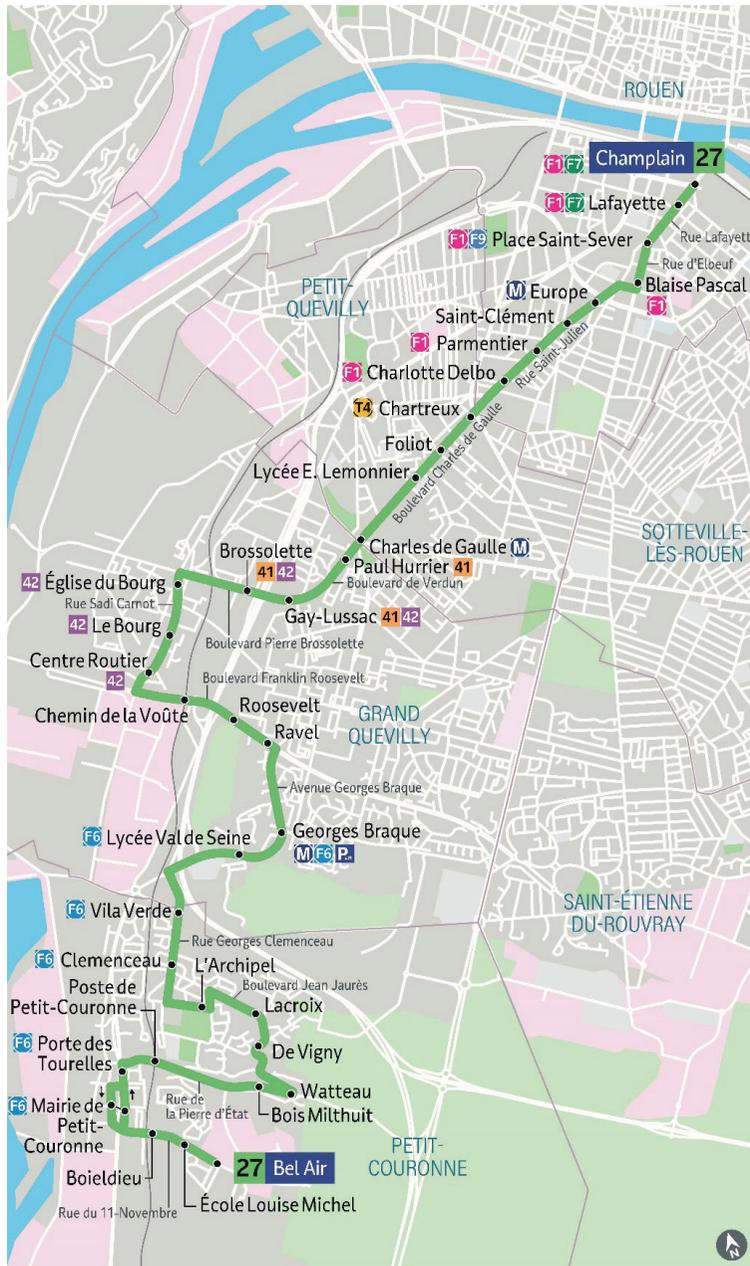


Plan de circulation n°2

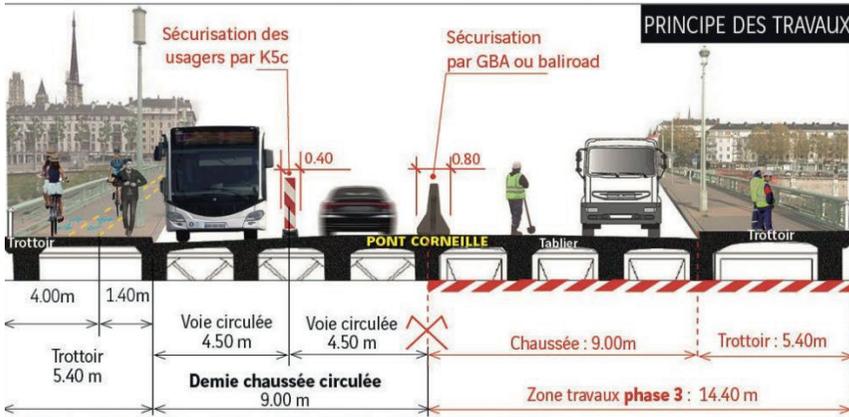


Légende

Circulation


- Section Barrée
- Sens non modifiée
- Sens modifiée
- Voie Bus
- Chantier

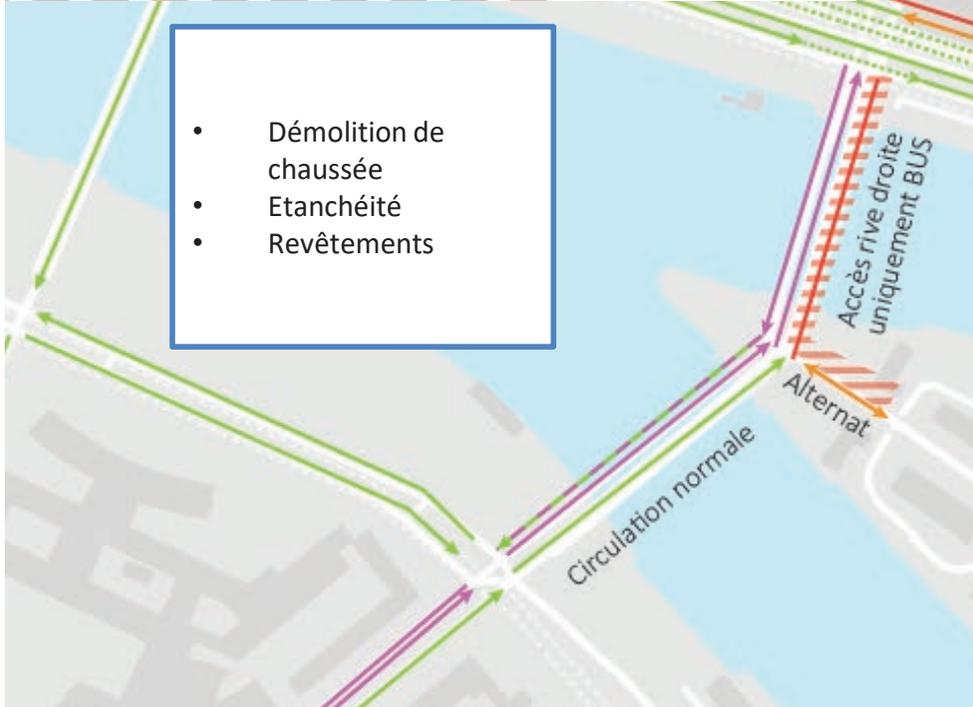

Plan de circulation n°3

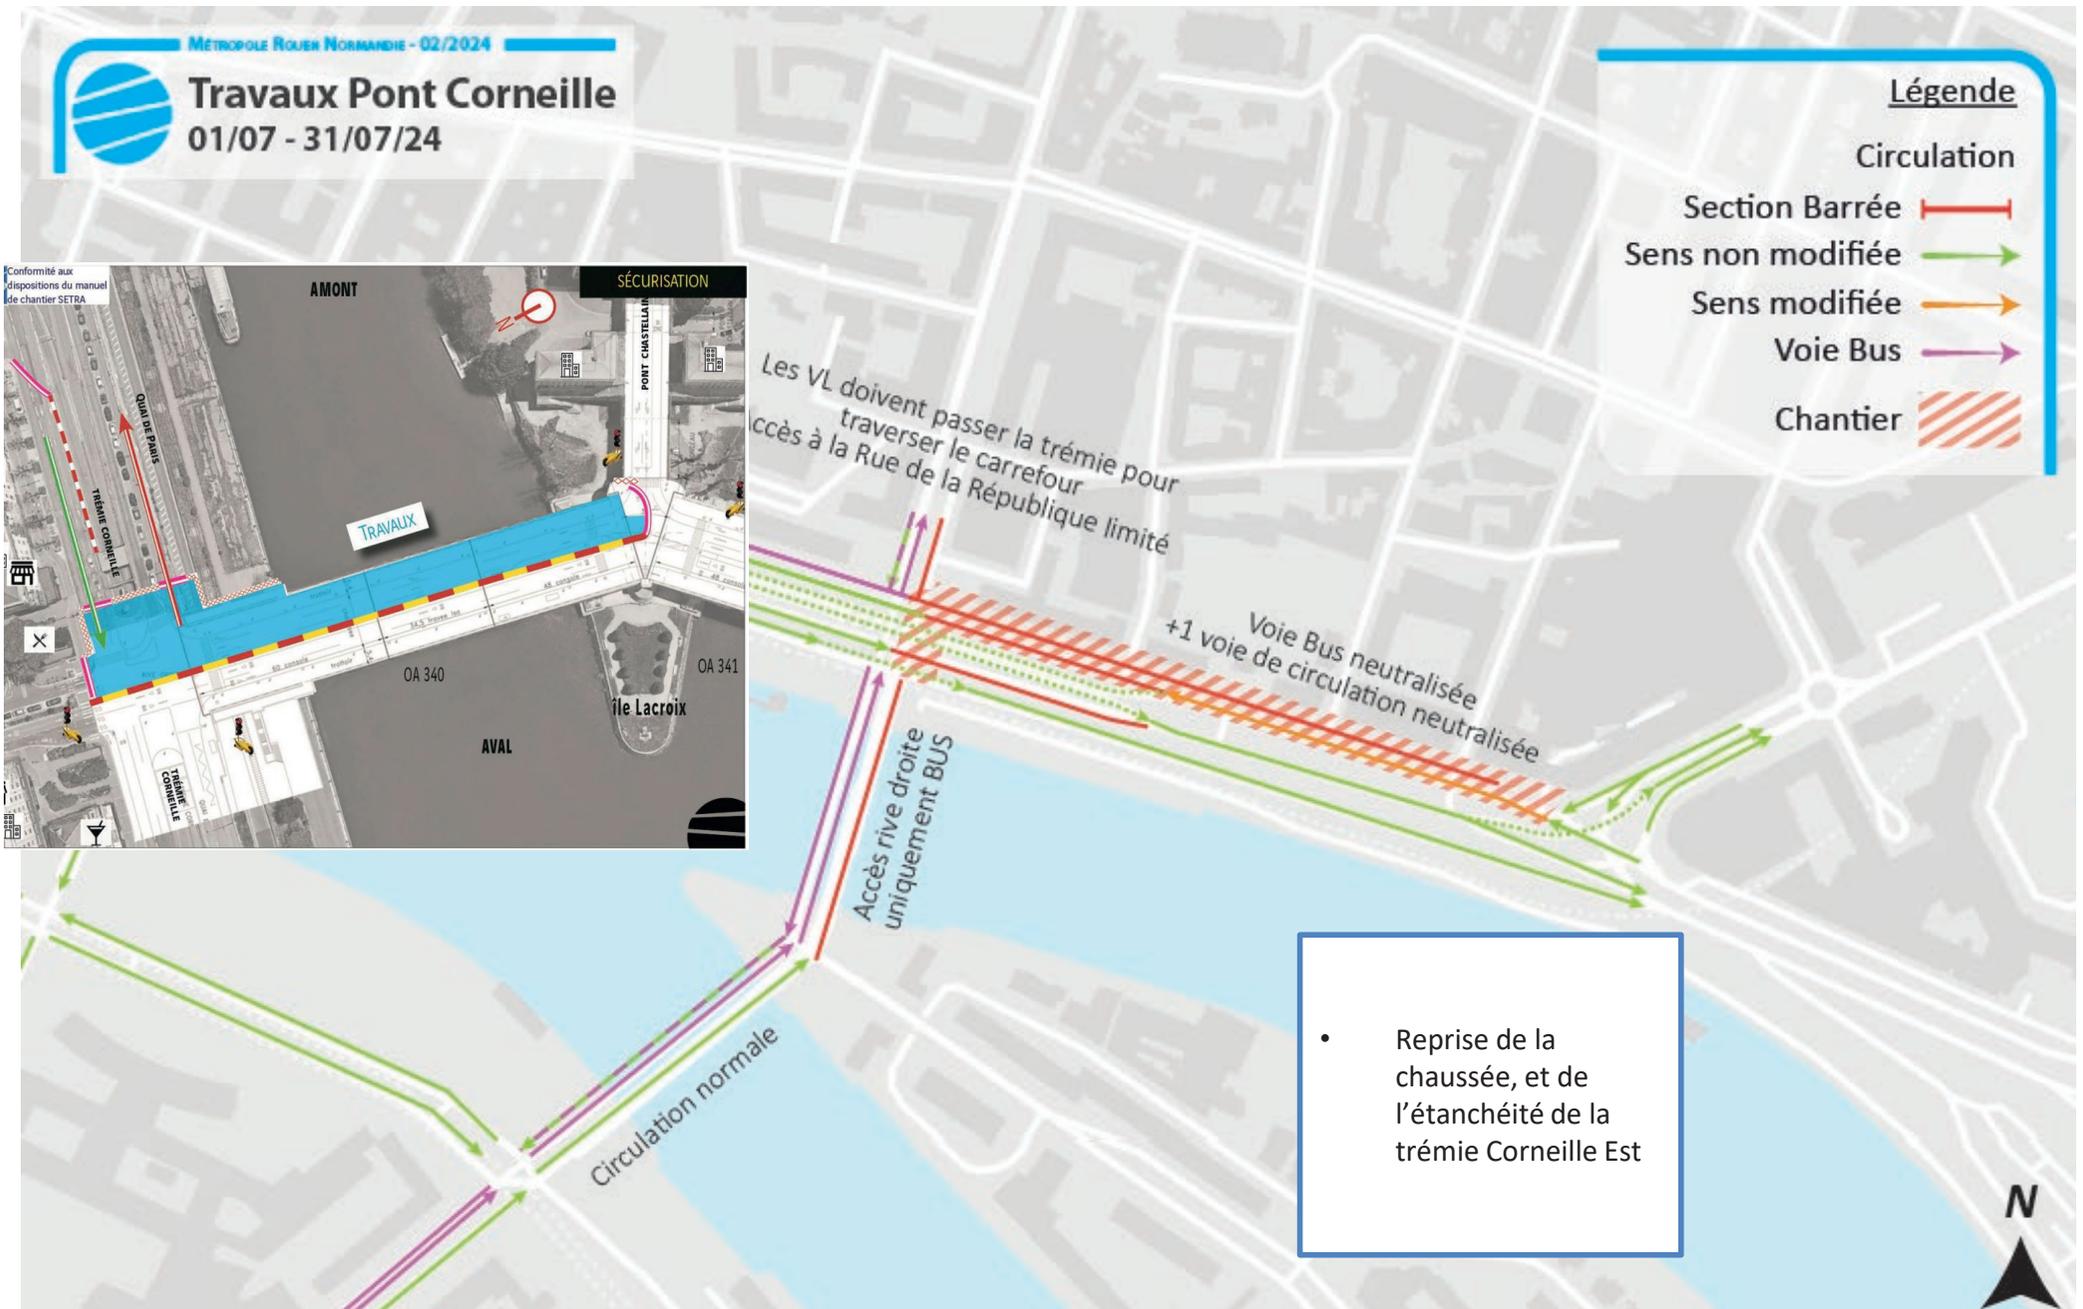



Plan de circulation n°4

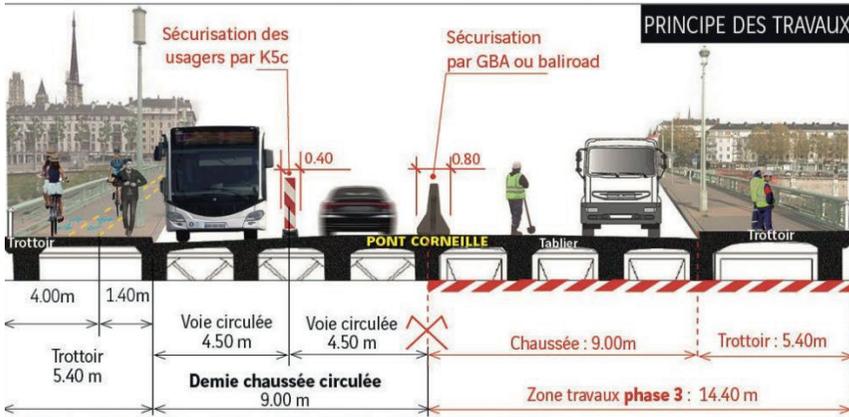


Légende

Circulation

- Section Barrée
- Sens non modifiée
- Sens modifiée
- Voie Bus
- Chantier

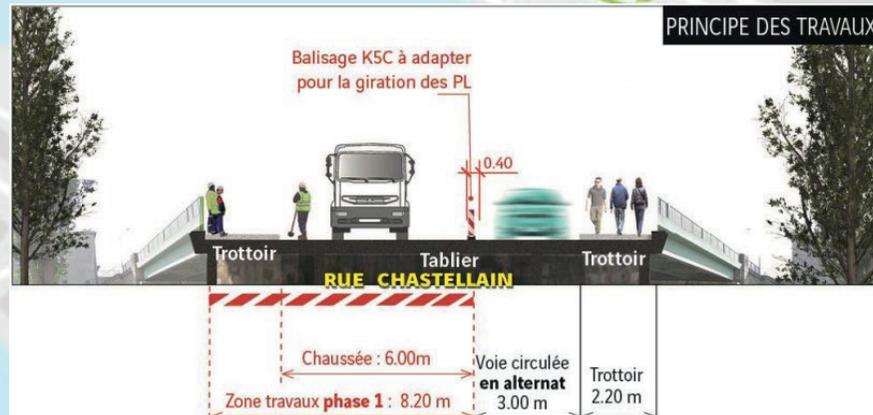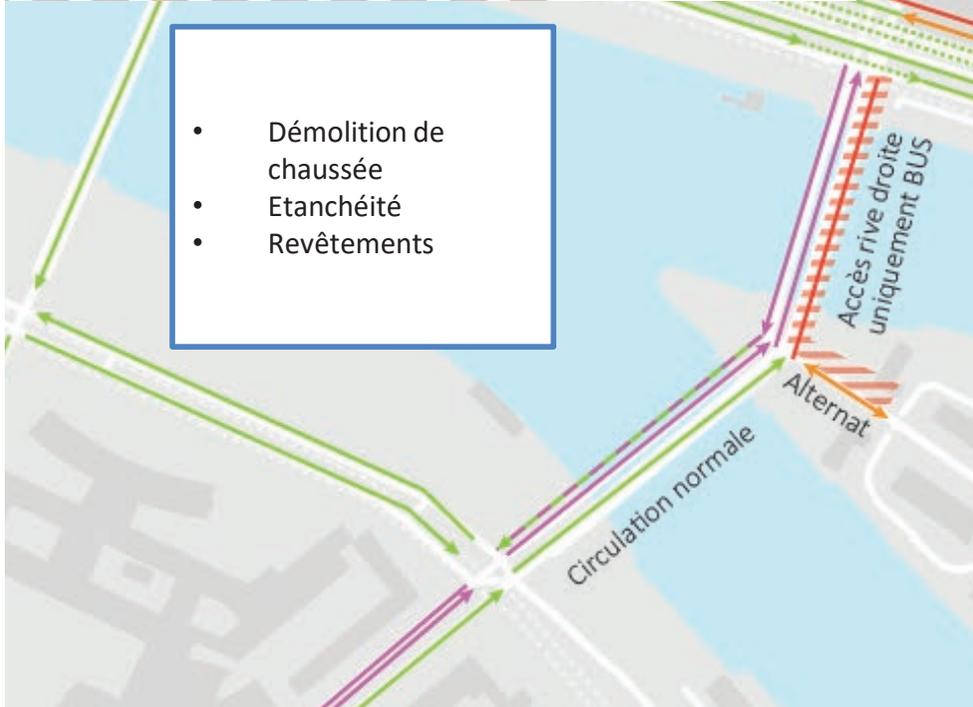

Plan de circulation n°5

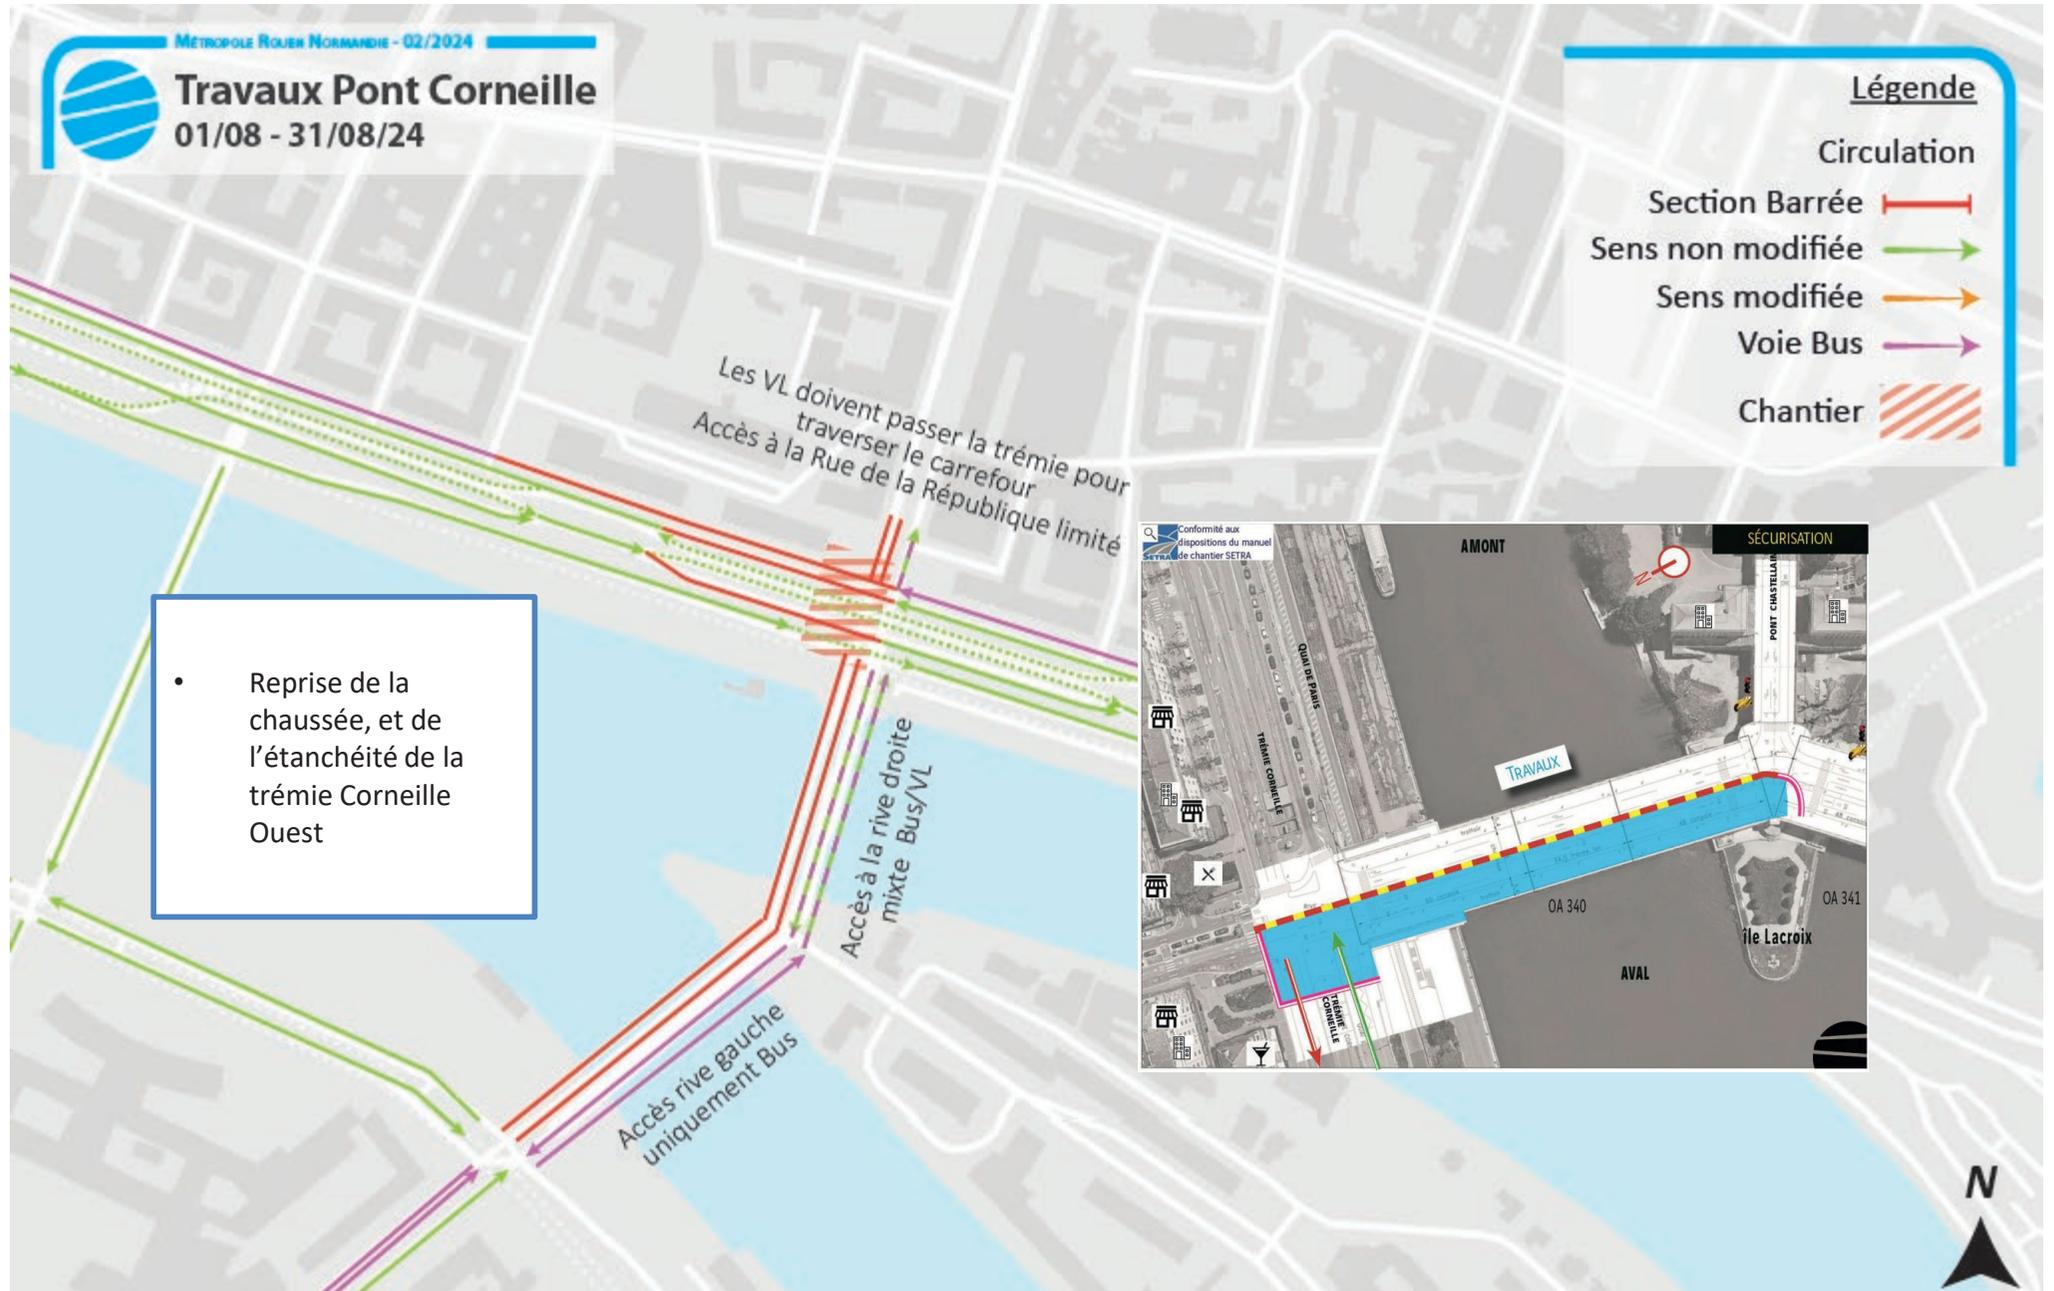

Plan de circulation n°6



MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE - 02/2024

Travaux Pont Cornaille
01/03/25 - 31/05/25

(Interruption des travaux de novembre 2024 à mars 2025)

Légende

Circulation

- Section Barrée
- Sens non modifiée
- Sens modifiée
- Voie Bus
- Chantier

